



МИНИСТЕРСТВО  
ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разработка рабочих планов региональных проектов с учетом требований методических указаний, направленных письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года П6-79372



- Нормативно-правовая база
- Форма рабочего плана регионального проекта
- Структура рабочего плана
- Сроки утверждения рабочих планов
- Порядок заполнения рабочих планов
- Особенности заполнения рабочих планов по типу результата «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества»
- Особенности заполнения рабочих планов по типу результата «Принятие НПА»
- Порядок подключения к работе с рабочими планами
- Обзор экранных форм интерфейсов по формированию рабочих планов
- Перечень ФЛК

## Нормативная правовая база:

### Методические рекомендации по разработке и внесению изменений в рабочие планы федеральных проектов от 16.12.2020

#### Рабочий план регионального проекта разрабатывается:

- В целях детализации плана мероприятий по реализации регионального проекта по отдельным типам результатов проекта;
- На срок реализации регионального проекта;
- Детализируется ежегодно по результатам (контрольным точкам), реализация которых предусмотрена в соответствующем году в соответствии с планом реализации;
- Согласуется администратором регионального проекта;
- Утверждается руководителем регионального проекта в течение месяца после утверждения паспорта регионального проекта.



**РАБОЧИЙ ПЛАН**  
**регионального проекта**  
(наименование регионального проекта)

**I Результаты регионального проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества**

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФГИАС)	Сведения о местоположении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>				Сроки реализации <sup>5</sup>	
							код	наименование	этажность	ед. измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание	
										код	наименование			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Результаты регионального проекта, соответствующие результатам федерального проекта, реализуемые органами исполнительной власти субъекта														
1.		(указывается результат федерального проекта)				X	X	X	X	X	X			
1.1.		(указывается результат федерального проекта в ___ году реализации)				X	X	X	X	X	X			
1.1.K.1.		(указываются контрольные точки в рамках результата федерального проекта в ___ году реализации)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1.1.		(указывается объект, создаваемый в рамках результата федерального проекта в ___ году)												
1.1.1.K.1.		(указываются контрольные точки объекта результата в ___ году реализации)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Результаты регионального проекта, соответствующие результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления														
2.		(указывается результат федерального проекта)				X	X	X	X	X	X			
2.1.		(указывается результат федерального проекта в ___ году реализации)				X	X	X	X	X	X			
2.1.K.1.		(указываются контрольные точки в рамках результата федерального проекта в ___ году реализации)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.1.1.		(указывается объект, создаваемый в рамках результата федерального проекта в ___ году)												
2.1.1.K.1.		(указываются контрольные точки объекта результата в ___ году)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Продолжение формы на следующем слайде



№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)			Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) <sup>2</sup>
			итого	по видам		ФБК	должность	организация <sup>3</sup>				
				консолидированный бюджет субъекта РФ	в том числе за счет необязательных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектам РФ			наименование	ИФП	КПН		
1	2	3	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Российской Федерации и подведомственными им государственными учреждениями												
1.		(указывается результат федерального проекта)										
1.1.		(указывается результат федерального проекта в ____ году реализации)										
1.1.К.1.		(указываются контрольные точки в рамках результата федерального проекта в ____ году реализации)	X	X	X							
1.1.1.		(указывается объект, ожидаемый в рамках результата федерального проекта в ____ году)										
1.1.1.К.1.		(указываются контрольные точки объекта результата в ____ году реализации)	X	X	X							
района и подведомственными им муниципальными учреждениями												
2.		(указывается результат федерального проекта)										
2.1.		(указывается результат федерального проекта в ____ году реализации)										
2.1.К.1.		(указываются контрольные точки в рамках результата федерального проекта в ____ году реализации)	X	X	X							
2.1.1.		(указывается объект, ожидаемый в рамках результата федерального проекта в ____ году)										
2.1.1.К.1.		(указываются контрольные точки объекта результата в ____ году)	X	X	X							





## Общий план

Результат

Ответственный за результат

Дата достижения результата

КТ результата

Ответственный за КТ

Дата достижения КТ



## Справочник «Перечень ОКС»

ОКС из соглашений

ОКС из наборов 7.13, 7.14 на ЕПБС



ОКС добавленные вручную по ВБИ

## Рабочий план

Результат

КТ результата

Ответственный за результат

Дата достижения результата

Заказчик

Ответственный исполнитель  
организации заказчика

Объект


Ответственный исполнитель  
объекта результата

Дата достижения объекта

КТ объекта результата

Ответственный за КТ объекта результата

Дата достижения КТ объекта результата



- Автоматическое формирование рабочих планов региональных проектов выполнено 11 января 2021 г.
- Возможность редактирования сведений в рабочих планах региональных проектов доступна с 12 января 2021 г.
- Срок утверждения рабочих планов **01 марта 2021 г.**



**Рабочий план состоит:**

Результат

---

КТ результата

---

Ответственный за результат

---

Дата достижения результата

---

Заказчик

---

Ответственный исполнитель  
организации заказчика

---

Объект

---

Ответственный исполнитель  
объекта результата

---

Дата достижения объекта

---

КТ объекта результата

---

Ответственный за КТ объекта  
результата

---

Дата достижения КТ объекта  
результата

**Участник проекта вносит изменения  
по следующим элементам:**

Ответственный исполнитель:  
заказчика, объекта результата, КТ  
объекта результата

---

Дата достижения: заказчика, объекта  
результата, КТ объекта результата

---

Добавление дополнительных КТ  
объектов результата

---

Установление вида работ результата

---

Добавление характеристики к  
объектам, КТ

---

Привязка объектов результата из  
строки «Нераспределенные  
значения» к значению результата

---

Ввод объемов финансирования по  
ОКС

---

Создание ОКС реализуемых за счет  
внебюджетных источников (при  
необходимости)

**Сведения, которые попадают в  
ПФ Рабочего плана:**

Результат, тип результата

---

КТ результата (из Плана мероприятий)

---

Ответственные исполнители  
результата, КТ результата

---

Даты достижения результата, КТ  
результата

---

Объект (мощность объекта, сроки  
реализации, объем финансового  
обеспечения, адрес, сведения о  
местонахождении, характеристика)

---

КТ объекта результата

---

Ответственные исполнители объекта  
результата, КТ объектов результата

---

Даты достижения объектов  
результата, КТ объектов результата



## Для результатов ФП с типом «Строительство», выполняемых на региональном уровне

1

Автоматическое формирование рабочего плана

2

Распределение ОКС по значениям результата

3

Назначение ответственного за объект

4

Редактирование данных объекта результата

5

Добавление дополнительной контрольной точки

6

Добавление ОКС реализуемого за счет внебюджетных источников (при необходимости)

7

Отправка на согласование



### Источники ОКС:



Соглашения



Наборы 7.13, 7.14 на ЕПБС (Важно: если при формировании наборов данных для одного ОКС необходимо указать несколько направлений инвестирования, такой ОКС должен быть привязан к одному результату регионального проекта).



Объект указывается в том году значения результата, по которому год окончания реализации совпадает с годом реализации проекта;



В случае необходимости внесения изменений в данные по объектам капитального строительства (загруженным автоматически), они должны осуществляться в соглашениях РОИВ в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет»;



Часть объектов результатов не может быть автоматически распределена по значениям результатов. Такие объекты результатов отображаются в секции «Нераспределенные значения»;



## Для результатов ФП с типом «Принятие НПА», выполняемых на региональном уровне

1

Автоматическое формирование рабочего плана

2

Добавление заказчика для значения результата

3

Добавление объекта для значения результата

4

Добавление дополнительной контрольной точки объекта результата

6

Отправка на согласование



### Источники:

- ▶ Автоматическое определение заказчика объекта (органа, ответственного за разработку) НПА
- ▶ Ручной ввод данных по объекту (выбор вида НПА из справочника, наименования, органа, принимающего документ).

▶ Под заказчиком объектов результатов с типом «Принятие нормативного правового акта» подразумевается РОИВ, ответственный за разработку НПА.

▶ Данные в секции «Заказчик» по умолчанию заполняются на основе сведений об организации ответственного исполнителя, указанного в разделе «Общий план» паспорта регионально проекта, с возможностью последующей корректировки.



- В настоящее время возможность формирования рабочих планов региональных проектов предоставлена участникам проекта с функциональной ролью администратора проекта и ответственного за результат.
- В случае если в процессе формирования рабочего плана требуется участие ответственных исполнителей объектов и (или) контрольных точек, следует:
  1. Указанным лицам в установленном порядке сформировать и направить заявки на регистрацию уполномоченных лиц с указанием полномочия;
  2. Добавить должностные лица в команду проекта;
  3. Осуществить назначение ответственных за объект/контрольные точки объекта.
- Полномочия для разработки и внесение изменений в рабочий план регионального проекта:  
УНП-Субъект. Согласование рабочего плана проекта  
(Ввод данных, Согласование, Утверждение, Просмотр).



Распределение результатов с типом «Строительство»:

1. Формирование рабочего плана начинается с распределения результатов проекта по Заказчикам, объектам, а также с формирования информации о датах достижения, ответственных исполнителях, объектах результатов и их контрольных точках в разделе меню паспорта регионального проекта «13.1 Распределение результатов по заказчикам и объектам».

Региональные проекты × РП: Паспорт проекта Культурная среда (Алтайский край) ×

Печать паспорта ↕ Синхронизировать с ФП 🚩 Перейти в ФП Редакция: Действующая редакция - A1-25-2020/007 - 29.12 🔍 🗨️ ✕ Версия паспорта: Версия 7 🔍 ✕

Обновить ✎ Редактировать 🚿 Фильтр по заказчику ⚙️

Тип результата	Единица измерения	Код результата ФП	Значение	Дата достижения значения результата	Значение на год	Распределено	Остаток	Ответственный исполнитель
▼ A1.00.01 Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 7,0000, Дата достижения: 31.12.2022, Единица измерения: Единица, Ответственный исполнитель: Кубрина Галина Александровна								
Строительство (ре...	Единица		4,0000	31.12.2021	3,0000	1,0000	3,0000	Кубрина Галина А...
Строительство (ре...	Единица		7,0000	31.12.2022	3,0000	0,0000	7,0000	Кубрина Галина А...
▶ A1.00.02 Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000, Дата достижения: 31.12.2024, Единица измерения: Единица, Ответственный исполнитель: Кубрина Галина Александровна								
▶ A1.00.04 Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды Значение: 1,0000, Дата достижения: 31.12.2024, Единица измерения: Единица, Ответственный исполнитель: Кубрина Галина Александровна								

Заказчики

Заказчик	Распределено значений	
	31.12.2021	31.12.2022
...	...	...
	1,0000	0,0000
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	1,0000	0,0000

13.1 Распределение результатов по заказчикам и объектам



2. В окне редактирования результата отражаются данные, сформированные автоматически на основании данных паспорта проекта (результаты, в рамках которых реализуются объекты капитального строительства и декомпозированные КТ из Общего плана проекта) и данных по объектам капитального строительства из соглашений РОИВ подсистемы бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет», а также информации из наборов 7.13 и 7.14 размещенной на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

(A1.00.01) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Обновить Добавить Редактировать Удалить Массовое добавление ДКТ Просмотр объекта Легенда Соисполнители  Скрыть КТ  Показать неиспользуемые КТ

Наименование заказчика/объекта/контрольной точки	Код ОКС	Вид работ результата	КТ не исп.	Ед. изм.	Значение	Дата достижения	Ответственный исполнитель
<b>Значение результата на 31.12.2021: распределено 1,0000 из 4,0000</b>							
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ					1,0000	31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
Универсальная спортивная площадка с. Фирсово Сретенского района Забайкальского края	376640000000...			Единица	1,0000	31.12.2021	Чернова Ирина Сергеевна
(4) Строительно-монтажные работы завершены			<input type="checkbox"/>			30.11.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
(5) Оборудование приобретено			<input type="checkbox"/>			30.06.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
(8) Техническая готовность объекта, %			<input type="checkbox"/>			30.06.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
(10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию			<input type="checkbox"/>			31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
(12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации			<input type="checkbox"/>			31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
(13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации			<input type="checkbox"/>			31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
(14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджета			<input type="checkbox"/>			31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
(15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов			<input type="checkbox"/>			31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
<b>Значение результата на 31.12.2022: распределено 0,0000 из 7,0000</b>							

3. Для корректировки данных необходимо выбрать объект или заказчика и нажать кнопку «Редактировать».

(А1.00.01) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Обновить Добавить **Редактировать** Удалить Массовое добавление ДКТ Просмотр объекта Легенда Соисполнители  Скрыть КТ  Показать неиспользуемые КТ

Наименование заказчика/объекта/контрольной точки	Код ОКС	Вид работ результата	КТ не исп.	Ед. изм.	Значение	Дата достижения	Ответственный исполнитель
...	...	...		...	=	=	...
Значение результата на 31.12.2021: распределено 1,0000 из 4,0000				Единица	4,0000	31.12.2021	Кубрина Галина Александр...
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ					1,0000	31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
<ul style="list-style-type: none"> <li>Универсальная спортивная площадка с. Фирсово Сретенского района Забайкальского края           <ul style="list-style-type: none"> <li>(4) Строительно-монтажные работы завершены</li> <li>(5) Оборудование приобретено</li> <li>(8) Техническая готовность объекта, %</li> <li>(10) Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию</li> <li>(12) Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской ...</li> <li>(13) Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федер...</li> <li>(14) С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджета...</li> <li>(15) Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов</li> </ul> </li> </ul>	376640000000...			Единица	1,0000	31.12.2021	Чернова Ирина Сергеевна
			<input type="checkbox"/>			30.11.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
			<input type="checkbox"/>			30.06.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
			<input type="checkbox"/>			30.06.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
			<input type="checkbox"/>			31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
			<input type="checkbox"/>			31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
			<input type="checkbox"/>			31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
			<input type="checkbox"/>			31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
			<input type="checkbox"/>			31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
Значение результата на 31.12.2022: распределено 0,0000 из 7,0000				Единица	7,0000	31.12.2022	Кубрина Галина Александр...



4. В открывшемся окне для редактирования доступно:

- изменение ответственного исполнителя для Заказчика (по умолчанию указан руководитель организации Заказчика);
- выбор вида работ результата по объектам результата (при выборе вида работ набор декомпозированных контрольных точек из паспорта проекта из раздела «Общий план» может измениться);
- изменение ответственного исполнителя объекта результата;
- создание дополнительных контрольных точек объекта результата.

**Заказчик и объекты**

Сохранить Сохранить и закрыть Закрыть

**Заказчик**

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
ИНН: 2221003564  
КПП: 222101001

Ответственный исполнитель: Безрукова Елена Евгеньевна  
Должность: Министр культуры Алтайского края

**Объект**

Обновить + Добавить - Удалить Поиск Просмотр объекта Соисполнители

Код	Наименование	Вид работ результата	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
...	...	...	...	=	...	...
376640000000190003	Универсальная спортивная площадка с. Фирново Сретенского района Забайкальского края	Не указано		31.12.2021	Чернова Ирина Сергеевна	

**Контрольные точки**

Обновить + Добавить - Удалить Редактировать Соисполнители Массовое добавление отв. исполнителя

Наименование КТ	Не используется	Дата достижения	Ответственный
...	...	=	...
Строительно-монтажные работы завершены	<input type="checkbox"/>	30.11.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
Техническая готовность объекта, %	<input type="checkbox"/>	30.06.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
Объект недвижимого имущества введен в эксплуата...	<input type="checkbox"/>	31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
Оборудование приобретено	<input type="checkbox"/>	30.06.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
Утверждены правила распределения и предоставлен...	<input type="checkbox"/>	31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна
Утверждено распределение межбюджетных трансфе...	<input type="checkbox"/>	31.12.2021	Безрукова Елена Евгеньевна





5. Карточка «Просмотр объекта» показывает подробную информацию по объекту. Источником данных является справочник «Перечень объектов капитального строительства» подсистемы бюджетного планирования ГИС «Электронный бюджет». В данной карточке осуществляется ввод финансового обеспечения.

**Просмотр объекта**

Сохранить | Сохранить и закрыть | Закрыть

37606442101 | с Пичугино

Адрес: село Пичугино Варгашинского района Курганской области

КБК: 054 0801 11 4 А1 55190 523 12

Адрес объекта (в соответствии с ФИАС):

Характеристика:

Информационная система (источник данных):

Ссылка на ГИС:

Является ГИС

Ссылка:


Объем финансового обеспечения объекта по годам реализации (тыс. руб.)

Год:	Всего:	из них:			Внебюджетные источники:
		консолидированный бюджет субъекта РФ	из них: в том числе за счет МБТ из ФБ бюджетам субъектам РФ		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 650 000,00	34 650 000,00	34 650 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	

Версия: Обслуживающий сервер:

начение	Дата достижения	Ответственный исполнитель
8,0000	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
1,0000	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
1,0000	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Константиновна
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	01.04.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	01.05.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
1,0000	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
1,0000	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...
	31.12.2021	Твердохлебова Дарья Конс...


6. В карточке «Заказчики и объекты» есть возможность добавить ОКС финансирование которого осуществляется за счет внебюджетных источников (при необходимости).

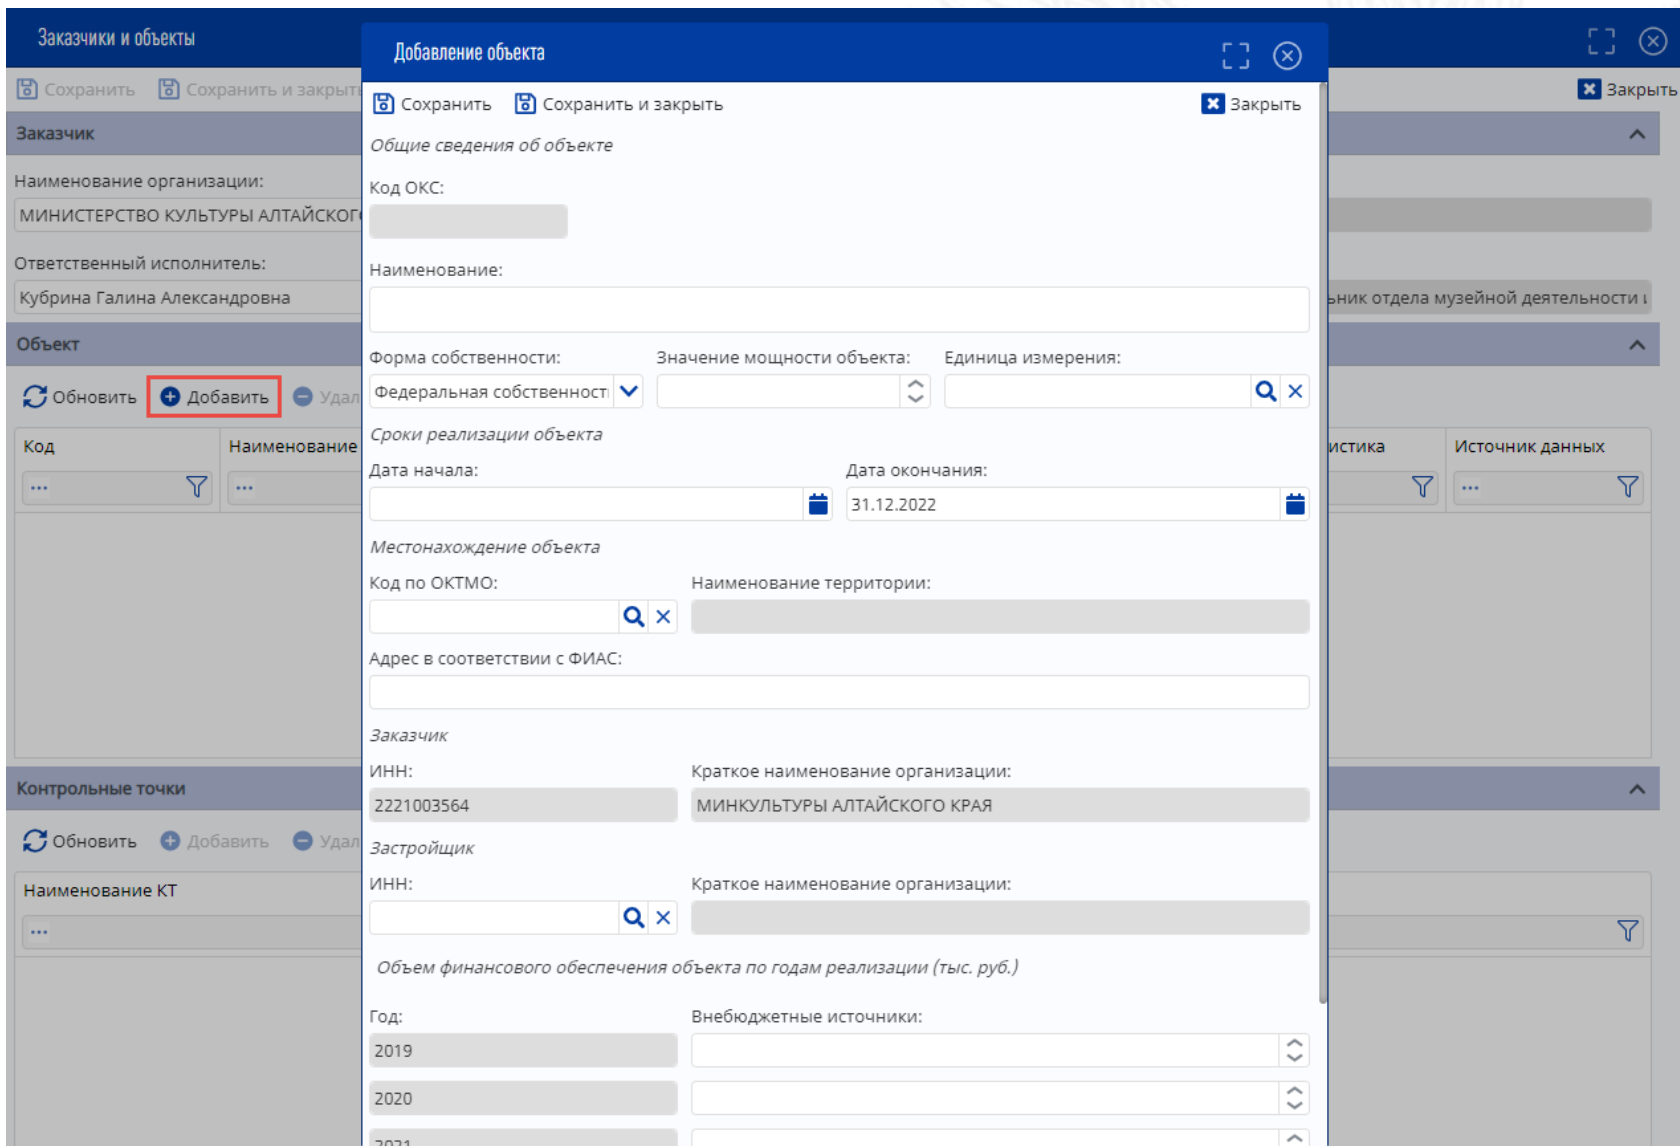

The screenshot displays the 'Заказчики и объекты' (Orders and objects) interface. A modal window titled 'Добавление объекта' (Add object) is open, allowing for the creation of a new object. The form is divided into several sections:

- Общие сведения об объекте (General information about the object):**
  - Код ОКС: [input field]
  - Наименование: [input field]
  - Форма собственности: [dropdown menu, currently 'Федеральная собственность']
  - Значение мощности объекта: [input field]
  - Единица измерения: [input field]
- Сроки реализации объекта (Object implementation periods):**
  - Дата начала: [calendar icon]
  - Дата окончания: 31.12.2022 [calendar icon]
- Местонахождение объекта (Object location):**
  - Код по ОКТМО: [input field]
  - Наименование территории: [input field]
  - Адрес в соответствии с ФИАС: [input field]
- Заказчик (Orderer):**
  - ИНН: 2221003564
  - Краткое наименование организации: МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
- Застройщик (Builder):**
  - ИНН: [input field]
  - Краткое наименование организации: [input field]
- Объем финансового обеспечения объекта по годам реализации (тыс. руб.) (Object financing volume by implementation years in thousand rubles):**
  - Год: 2019, 2020, 2021
  - Внебюджетные источники: [dropdown menu]

Распределение результатов с типом «Принятие нормативного правового (правового) акта»:  
7. Для распределения результата регионального проекта с типом «Принятие нормативного правового (правового) акта» необходимо выбрать результат регионального проекта и нажать кнопку «Редактировать».

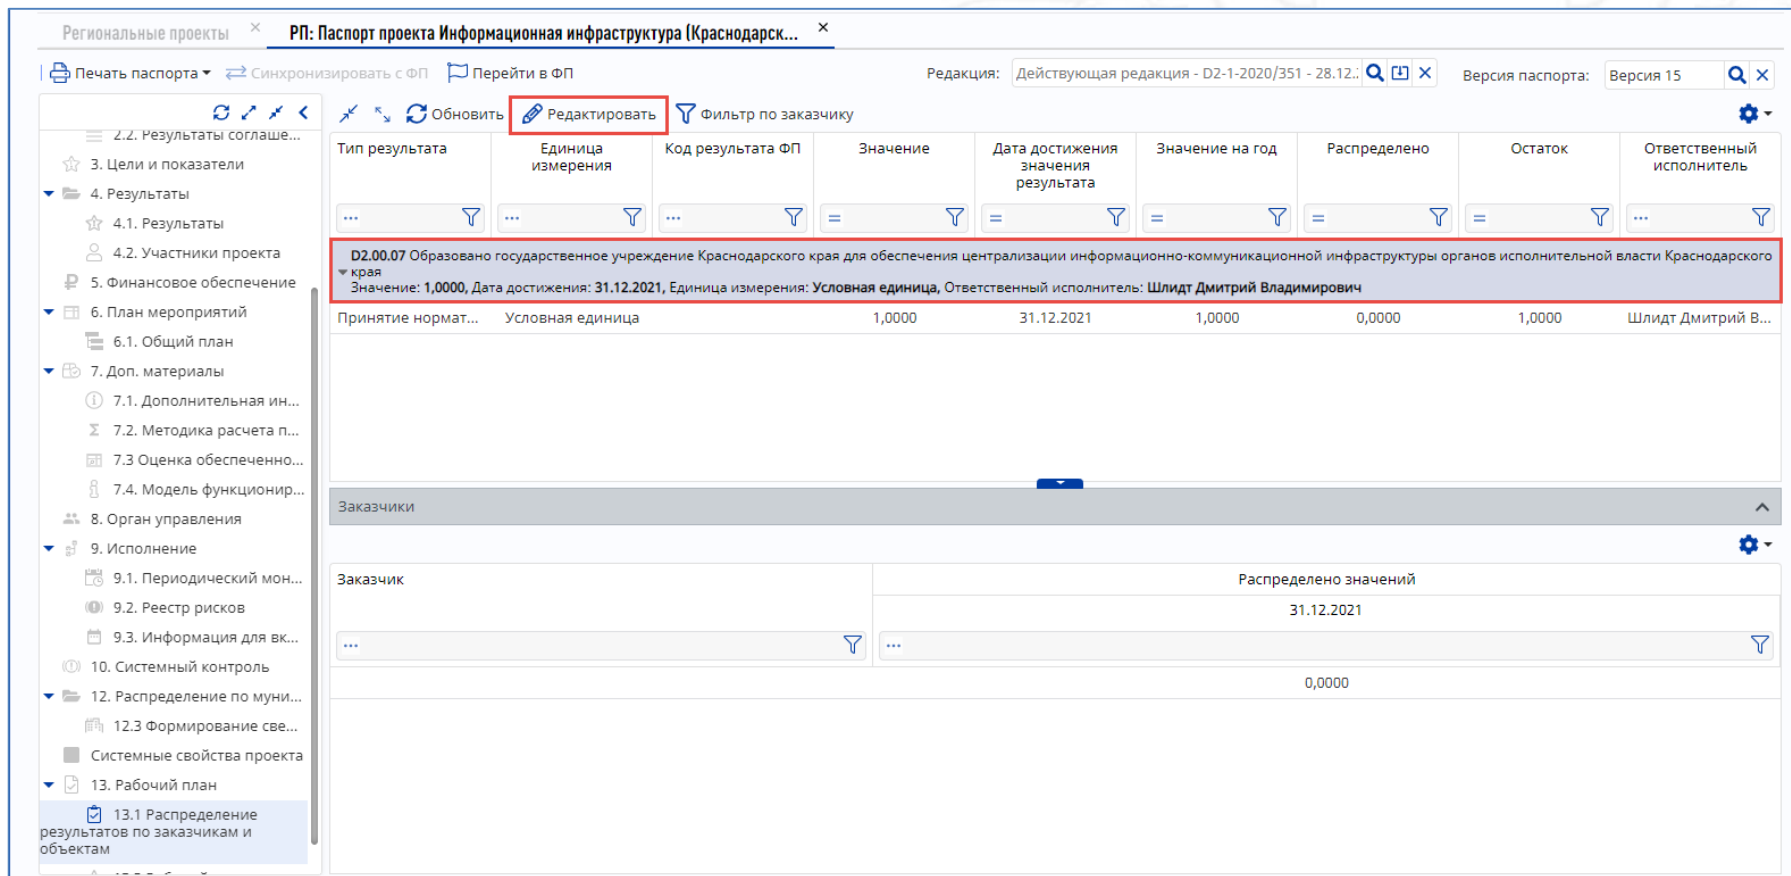

Региональные проекты × РП: Паспорт проекта Информационная инфраструктура (Краснодарск... ×

Печать паспорта | Синхронизировать с ФП | Перейти в ФП | Редакция: Действующая редакция - D2-1-2020/351 - 28.12.2021 | Поиск | Версия паспорта: Версия 15 | Поиск

Обновить | **Редактировать** | Фильтр по заказчику

Тип результата	Единица измерения	Код результата ФП	Значение	Дата достижения значения результата	Значение на год	Распределено	Остаток	Ответственный исполнитель
...	...	...	=	=	=	=	=	...
<b>D2.00.07</b> Образовано государственное учреждение Краснодарского края для обеспечения централизации информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Краснодарского края Значение: 1,0000, Дата достижения: 31.12.2021, Единица измерения: Условная единица, Ответственный исполнитель: Шлидт Дмитрий Владимирович								
Принятие нормат...	Условная единица		1,0000	31.12.2021	1,0000	0,0000	1,0000	Шлидт Дмитрий В...

Заказчики

Заказчик	Распределено значений
...	31.12.2021
...	0,0000

13.1 Распределение результатов по заказчикам и объектам

8. Под заказчиком объектов результатов с типом «Принятие нормативного правового акта» подразумевается РОИВ, ответственный за объект результата. Для добавления заказчика и объекта результата необходимо выполнить следующие действия: выделить значение результата, для которого необходимо добавить объект результата, и нажать кнопку «Добавить».

(02.00.07) Образовано государственное учреждение Краснодарского края для обеспечения централизации информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Краснодарского края

Обновить **Добавить** Редактировать Удалить Массовое добавление ДКТ Просмотр объекта Легенда Соисполнители  Скрыть КТ  Показать неиспользуемые КТ

Наименование заказчика/объекта/контрольной точки	Вид нормативного пр...	КТ не исп.	Ед. изм.	Значение	Дата достижения	Ответственный исполнитель	
...	...		...	=	=	...	
Значение результата на 31.12.2021: распределено 0,0000 из 1,0000				Условная единица	1,0000	31.12.2021	Шлидт Дмитрий Владимирович



9. Откроется окно «Заказчики и объекты» с возможностью редактирования данных в секции «Заказчик», в поле «Наименование организации» и «Ответственный исполнитель», а также добавления объекта результата и его дополнительных контрольных точек.

Данные в секции «Заказчик» по умолчанию заполняются на основе сведений об организации ответственного исполнителя, указанного в разделе «Общий план» паспорта регионального проекта, с возможностью последующей корректировки.


В случае необходимости редактирования поля «Наименование организации» нужно нажать кнопку «лупа»


Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закрыть

Необходимо сохранить изменения по заказчику перед добавлением данных по объекту

**Заказчик**

Наименование организации: ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ КРАСНОДАРСКОГО РАЙОНА  X ИНН: 2308178382 КПП: 230801001

Ответственный исполнитель: Шлидт Дмитрий Владимирович  X Должность: Заместитель руководителя департамента

**Объект**

Обновить + Добавить Редактировать Удалить Просмотр объекта Соисполнители

Наименование НПА	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
...	...	=	...	...

**Контрольные точки**

Обновить + Добавить Удалить Редактировать Соисполнители Массовое добавление отв. исполнителя

Наименование КТ	Не используется	Дата достижения	Ответственный
...	...	=	...

10. Добавление объекта результата осуществляется нажатием на кнопку «Добавить».

Заказчики и объекты

Сохранить Сохранить и закрыть Закрыть

### Заказчик

Наименование организации:  ИНН:  КПП:

Ответственный исполнитель:  Должность:

### Объект

Обновить **Добавить** Редактировать Удалить Просмотр объекта Соисполнители

Наименование НПА	Вид НПА	Дата достижения	Ответственный	Характеристика
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="="/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

### Контрольные точки

Обновить **Добавить** Удалить Редактировать Соисполнители Массовое добавление отв. исполнителя

Наименование КТ	Не используется	Дата достижения	Ответственный
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="="/>	<input type="text" value="..."/>



11. Форма добавления объекта с типом результата «Принятие нормативного правового (правового) акта»

### Добавление объекта

Сохранить Сохранить и закрыть Закрыть

Статус НПА:  
Проект

Вид НПА:

Наименование НПА:

Орган, принимающий документ:

Дата достижения: 31.12.2021 Ответственный исполнитель: Казарин Станислав Валериевич

Характеристика:

Информационная система (источник данных):


Ссылка на ГИС:  
 Является ГИС

Ссылка:

12. Раздел 13.2 «Рабочий план» предназначен для отображения обобщенной информации по результатам проекта: о датах достижения, ответственных исполнителях, объектах результатов и их контрольных точках. Отображение данных в Рабочем плане регионального проекта осуществляется в зависимости от роли пользователя. Редактирование данных в разделе «Рабочий план» запрещено.

Через кнопку «Действия» Администратором проекта в разделе 13.2 Рабочий план осуществляется процесс согласования информации ответственных исполнителей.


В колонке «Согласующий» отражается ФИО сотрудника, которому элемент направляется на согласование.

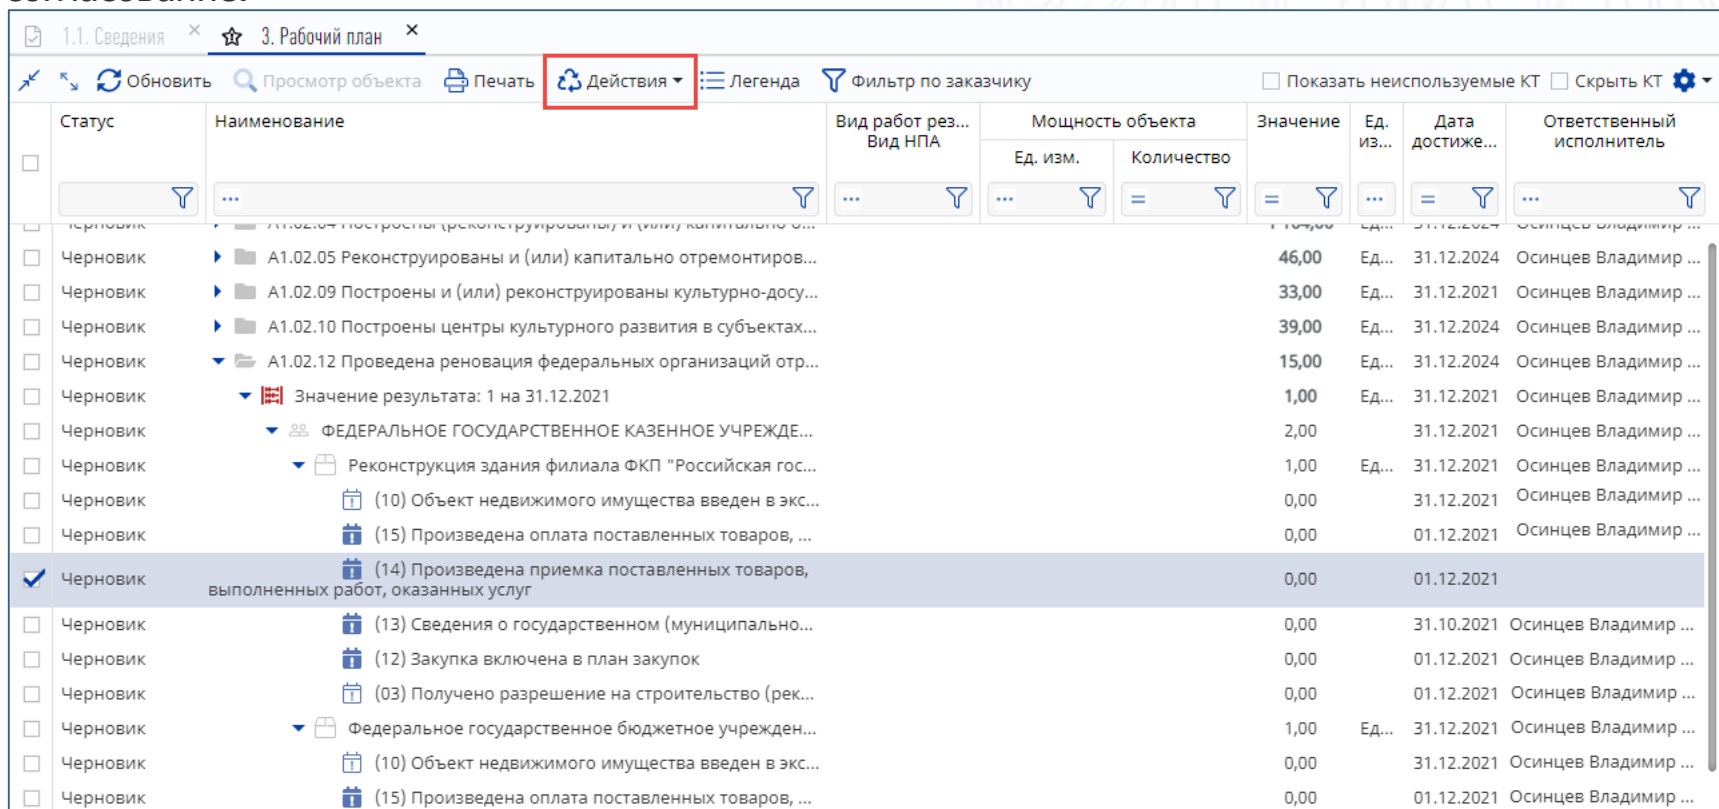

Статус	Наименование	Вид работ рез... Вид НПА	Мощность объекта		Значение	Ед. изм...	Дата достиже...	Ответственный исполнитель
			Ед. изм.	Количество				
<input type="checkbox"/>	Черновик	...	...	=	=	...	=	...
<input type="checkbox"/>	Черновик	A1.02.05 Реконструированы и (или) капитально отремонтиров...			46,00	Ед...	31.12.2024	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	A1.02.09 Построены и (или) реконструированы культурно-досу...			33,00	Ед...	31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	A1.02.10 Построены центры культурного развития в субъектах...			39,00	Ед...	31.12.2024	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	A1.02.12 Проведена реновация федеральных организаций отр...			15,00	Ед...	31.12.2024	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	Значение результата: 1 на 31.12.2021			1,00	Ед...	31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕ...			2,00		31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	Реконструкция здания филиала ФКП "Российская гос...			1,00	Ед...	31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(10) Объект недвижимого имущества введен в экс...			0,00		31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(15) Произведена оплата поставленных товаров, ...			0,00		01.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Черновик	(14) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг			0,00		01.12.2021	
<input type="checkbox"/>	Черновик	(13) Сведения о государственном (муниципально...			0,00		31.10.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(12) Закупка включена в план закупок			0,00		01.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(03) Получено разрешение на строительство (рек...			0,00		01.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	Федеральное государственное бюджетное учрежден...			1,00	Ед...	31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(10) Объект недвижимого имущества введен в экс...			0,00		31.12.2021	Осинцев Владимир ...
<input type="checkbox"/>	Черновик	(15) Произведена оплата поставленных товаров, ...			0,00		01.12.2021	Осинцев Владимир ...




13. Отправка документа на согласование ВПО осуществляется из раздела меню «13.2 Рабочий план» администратором проекта. Отправка доступна через нажатие на кнопку «Действия» и выбор из списка действий «Направить на утверждение». Кнопка «Направить на утверждение» доступна для результатов в состоянии «Согласовано»

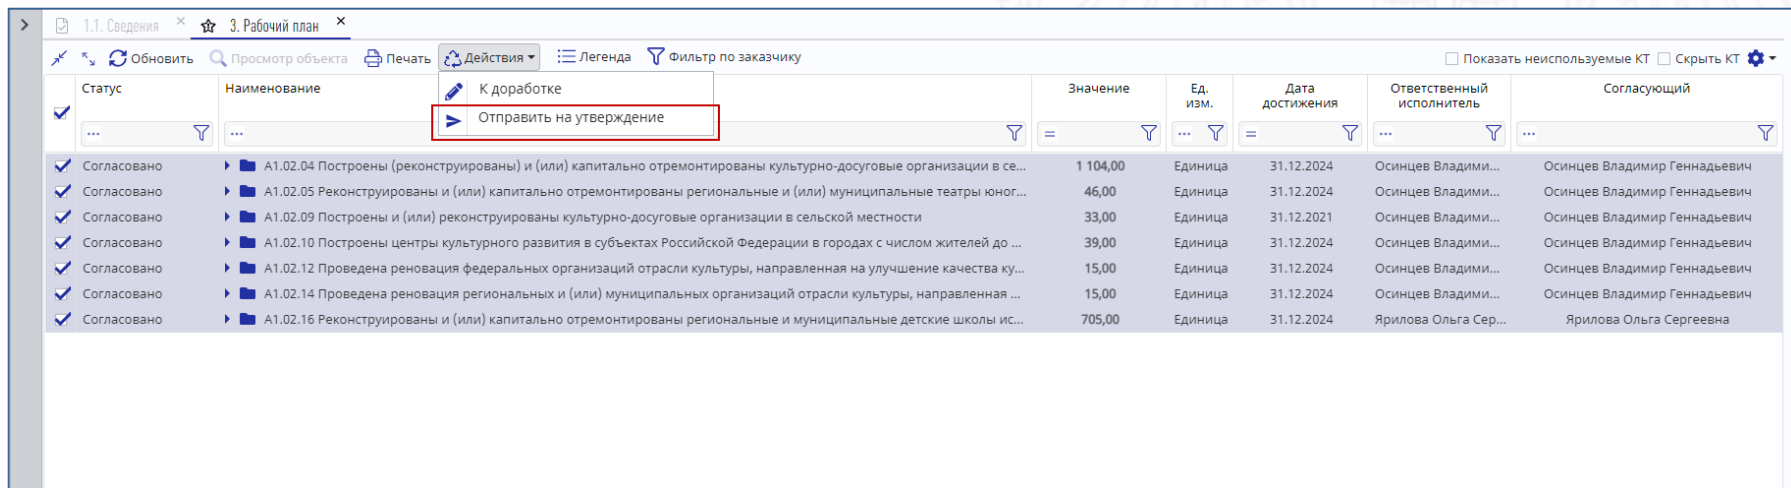

The screenshot displays a web application interface for managing work plans. At the top, there are navigation tabs for '1.1. Сведения' and '3. Рабочий план'. Below the tabs is a toolbar with buttons for 'Обновить', 'Просмотр объекта', 'Печать', 'Действия', 'Легенда', and 'Фильтр по заказчику'. The 'Действия' menu is open, showing two options: 'К доработке' and 'Отправить на утверждение', with the latter highlighted by a red box. The main area contains a table with columns for 'Статус', 'Наименование', 'Значение', 'Ед. изм.', 'Дата достижения', 'Ответственный исполнитель', and 'Согласующий'. The table lists several items, all with a status of 'Согласовано'.

Статус	Наименование	Значение	Ед. изм.	Дата достижения	Ответственный исполнитель	Согласующий
Согласовано	A1.02.04 Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в се...	1 104,00	Единица	31.12.2024	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.05 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юног...	46,00	Единица	31.12.2024	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.09 Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности	33,00	Единица	31.12.2021	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.10 Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до ...	39,00	Единица	31.12.2024	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.12 Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества ку...	15,00	Единица	31.12.2024	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.14 Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная ...	15,00	Единица	31.12.2024	Осинцев Владими...	Осинцев Владимир Геннадьевич
Согласовано	A1.02.16 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы ис...	705,00	Единица	31.12.2024	Ярилова Ольга Сер...	Ярилова Ольга Сергеевна

14. Утверждение Рабочего плана осуществляется в реестре согласования документов (рабочий план ФП).



- Утверждение рабочего плана осуществляет руководитель проекта.
- В случае успешного согласования и утверждения рабочего плана в реестре согласования документов (рабочий план РП) в разделе 13.2 «Рабочий план» статус автоматически изменится на «Утвержден».
- В случае возврата документа на доработку требуется внесение изменений в Рабочий план в разделе 13.1 «Распределение результатов по заказчикам и объектам» в соответствии с причинами возврата на доработку. Статус в разделе 13.7 «Версии рабочего плана» автоматически изменится на «На доработке».



## Контроли используемые в рабочих планах

- ▶ Контроль на неперевышение даты достижения значения результата при редактировании даты достижения объекта результата;
- ▶ Контроль на неперевышение даты достижения объекта результата при редактировании даты достижения дополнительной контрольной точки;
- ▶ Контроль на неперевышение даты достижения декомпозированных КТ из Общего плана при редактировании даты достижения контрольной точки в Рабочем плане;
- ▶ Контроль на неперевышение значения результата при создании объектов результата с типом «Принятие НПА»;
- ▶ Контроль при отправке документа рабочий план на согласование руководителю проекта на текущий статус согласования результатов.
- ▶ Контроль при вводе объема финансирования по ОКС



## Ограничения/правила используемые в рабочих планах

- ▶ Ограничение при назначении ответственных исполнителей объектов результатов и контрольных точек (*Назначение ответственным за объект/контрольную точку объекта доступно только для сотрудников организации заказчика*);
- ▶ Ограничение на возможность редактирования в зависимости от выбранной редакции рабочего плана (*Редактирование доступно в состоянии версии рабочего плана «Черновик»*);
- ▶ Ограничение отражения и редактирования данных по ответственности за элемент - результат, объект результата, контрольная точка объекта результата (*В зависимости от роли и участия в проекте, пользователю доступны только определенные элементы рабочего плана*);
